

Eigen-Überwachungsbericht Nr.: _____

Name:
 Datum:
 Herstellwerk:


 HWK – Nr.: .../.....

Objekt:.....
 Anschrift:
 Straße, PLZ, Ort
 Anzahl der Türen:
 Übereinstimmungszeichen Nrn.:
 überwachte Tür Ü-Zeichen Nr.:
 Überwachung durch ÜG.....
 Herr/Frau:.....
 eingesehen am:.....

T30-2-FSA „Hueck LAVA 77-30“ T30-2-RS-FSA „Hueck LAVA 77-30“
 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung
 Z-6.20-2144 vom 13.10.2022, Geltungsdauer vom 03.11.2022 bis 03.11.2027

Die **Kennzeichnung** bezieht sich in gleicher Weise auf die Feuerschutzabschlüsse mit und ohne Oberteil und Seitenteil(e). Siehe Zulassung 1.1.2.

Rahmenaußenmaße Tür:

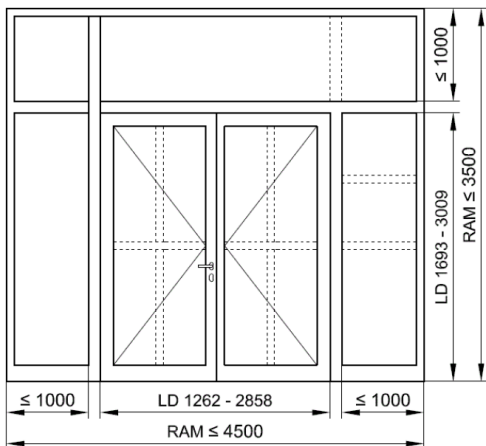

Breite:
 Höhe:
 Anschlag nach DIN: links / rechts

Komplettes Elementmaß RAM mit Seitenteil(e) und Oberteil:

Breite:
 Höhe:

Hinweis:

In Abhängigkeit von der Größe und der Ausführung ist gegebenenfalls die Zulassung Z-19.14-2049 zu beachten.

| Geprüfte Tür- bzw. Elementausführung auswählen | Zugelassene Tür- bzw. Elementabmessungen | | | | |
|--|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| | Lichte Durchgangsmaße Tür „LD“ | | Gangflügel lichte Öffnungsbreite | Rahmenaußenmaße FSA „RAM“ | |
| | Breite | Höhe | | Breite | Höhe |
| | von / bis | von / bis | von / bis | von / bis | von / bis |
| <input type="checkbox"/> Tür | 1262 - 2858 | 1693 – 3009 | 872 - 1450 | 1365 - 3000 | 1745 –3275 |
| <input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil | 1262 - 2858 | 1693 – 3009 | 872 - 1450 | 1365 - 3000 | 1875 –4120 |
| <input type="checkbox"/> Tür mit 1 Seitenteil li. oder re.* | 1262 - 2858 | 1693 – 3009 | 872 - 1450 | 1518 - 4000 | 1745 –3275 |
| <input type="checkbox"/> Tür mit 2 Seitenteilen li. und re. | 1262 - 2858 | 1693 – 3009 | 872 - 1450 | 1672 - 4500 | 1745 –3275 |
| <input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil u. 1 Seitenteil li. od. re.* | 1262 - 2858 | 1693 – 3009 | 872 - 1450 | 1518 - 4000 | 1875 –3500 |
| <input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil u. 2 Seitenteilen li. u. re. | 1262 - 2858 | 1693 – 3009 | 872 - 1450 | 1672 - 4500 | 1875 –3500 |
| <input type="checkbox"/> Tür eingebaut in F30-Verglasung | 1262 - 2858 | 1693 – 3009 | 872 - 1450 | 1518 - unbegrenzt | 1745 –5000 |

1.0 Maßkontrolle Zusammenbau

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Rahmenaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm): | Ja / Nein | Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich: | Ja / Nein |
| Flügelaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm): | Ja / Nein | Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich: | Ja / Nein |
| Luftspaltkontrolle/Schattenfugen auf Bandseite gemessen: | | | |
| oben/li/re/mitte: $6 \pm 1,5$ mm | Ja / Nein | unten: gemäß Detail KM | Ja / Nein |
| Anmerkung: | | | |

2.0 / 3.0 Profile

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Profile entsprechend Stückliste: | | Falzdichtungen gem. Stückliste: | Ja / Nein |
| Blendrahmenprofile Tür + Umfeld | Ja / Nein | ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste: | Ja / Nein |
| Flügelprofile einschl. Sockel und Riegel | Ja / Nein | ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste: | Ja / Nein |
| Eckverbindungen gemäß Konstruktionsvorgabe | Ja / Nein | | |
| Verwendeter Kleber | Typ: | | |
| Anmerkung: | | | |

4.0 Beschläge und Zubehör

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Bänder gemäß Stückliste | Ja / Nein | Anzahl Bänder je Flügel: | |
| Bandposition gemäß Konstruktionsvorgabe | Ja / Nein | | |
| Sicherungsbolzen gemäß Stückliste | Ja / Nein | Anzahl Si-Bolzen je Flügel: | |
| Position gemäß Konstruktionsvorgabe | Ja / Nein | | |
| Schlösser gemäß Stückliste | Ja / Nein | Fallenspiel i.O. | Ja / Nein |
| Wenn NEIN : Schlosstyp (Artikelnr./ Bezeichnung): | | | |
| Lage + Befestigung lt. Konstruktionsvorgabe | Ja / Nein | | |
| Zubehör (E-Öffner / Kontakte) | | | |
| Zubehör gemäß Stückliste | Ja / Nein | Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe? | Ja / Nein |
| sonstiges Zubehör: | | | |

Türdrücker

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| gemäß Stückliste | Ja / Nein | Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe? | Ja / Nein |
| Ausführung FSA (DIN 18273 / EN 179 / EN 1125)? | Ja / Nein | Typ: | |
| Drückerstift: | | | |

Anmerkung:

Türschliesser / Türantrieb

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| gemäß Stückliste | Ja / Nein | Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe? | Ja / Nein |
| Befestigungsart: | | | |
| Montageplatte (n): | | | |
| ggf. innenliegend Systemzubehör gemäß Vorgabe: | Ja / Nein | | |

Anmerkung / weitere Komponenten:

5. Füllung (Verglasung Paneel einschließlich Glasleiste und Dichtung)

Glastyp:

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Glasdichtung gemäß Stückliste | Ja / Nein | Ätziegel und Aufkleber vorhanden | Ja / Nein |
| Klotzmaterial gemäß Konstruktionsvorgabe | Ja / Nein | Aufschäumer im Glasfalz (falls erforderlich) | Ja / Nein |

Anmerkung:

6. Bodendichtung RS (nach DIN 18095)

| | | | |
|-----------------------------|-----------|---|-----------|
| Ausführung gemäß Stückliste | Ja / Nein | Abdichtung / Dichteinheit nach Vorgabe: | Ja / Nein |
|-----------------------------|-----------|---|-----------|

Anmerkung / weitere Komponenten:

7. Funktionsprüfung und Kennzeichen

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Funktionsprüfung ausgeführt und i.O.: | Ja / Nein |
| Kennzeichen auf Flügel angebracht: | Ja / Nein |

Anmerkung:

Mitgeltende Dokumente sind als ANLAGE zu dem Bericht abzuspeichern und auf Verlangen vorzulegen!

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| in Bezug genommene Stückliste / Werkauftrag exakte Bezeichnung / Auftragsnummer: | | | |
| Abweichungsbericht / Fehlerprotokoll | Ja / Nein | | |
| zugrundeliegendes Dok A zur Zulassung: wesentl. Materialien / Komponenten + die techn. Ausführung entspr. Dok A : | Ja / Nein | | |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Eigenüberwachung ausgeführt am (Datum): | | Anmerkung / Notizen: |
| Signatur / Unterschrift verantwortl. Mitarbeiter(in) | | |
