
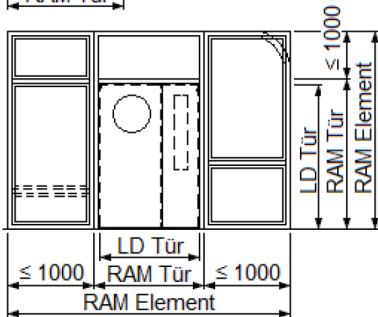


Eigen-Überwachungsbericht Nr.: _____

Name: Datum: Herstellwerk: HWK – Nr.: .../.....	Objekt:..... Anschrift: Straße, PLZ, Ort Anzahl der Türen: Übereinstimmungszeichen Nrn.: überwachte Tür Ü-Zeichen Nr.: Überwachung durch ÜG..... Herr/Frau:..... eingesehen am:.....
--	--

<input type="checkbox"/> T30-2-FSA „STB2-TSH“	<input type="checkbox"/> T30-2-RS-FSA „STB2-TSH“
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung	
Z-6.20-2284 vom 27.10.2022, Geltungsdauer vom 03.11.2022 bis 03.11.2027	

Die **Kennzeichnung** bezieht sich in gleicher Weise auf die Feuerschutzabschlüsse mit und ohne Oberteil und Seitenteil(e). Siehe Zulassung 1.1.2.



Rahmenaußenmaße Tür:

Breite:
 Höhe:
 Anschlag nach DIN: links / rechts

Komplettes Elementmaß RAM mit Seitenteil(e) und Oberteil:

Breite:
 Höhe:

Hinweis:

In Abhängigkeit von der Größe und der Ausführung ist gegebenenfalls die Zulassung Z-19.14-1234 zu beachten.

Geprüfte Tür- bzw. Elementausführung ankreuzen	Zugelassene Tür- bzw. Elementabmessungen				
	Lichte Durchgangsmaße Tür		Lichte Breite Gangflügel	Rahmenaußenmaße (RAM) Tür/Element	
	Breite	Höhe		Breite	Höhe
	von / bis	von / bis	von / bis	von / bis	von / bis
<input type="checkbox"/> Tür	1230 – 2769	1685 – 3015	510 – 1365	1355 – 2829	1740 – 3085
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil	1230 – 2769	1685 – 3015	510 – 1365	1355 – 2829	1865 – 3070 / 4000
<input type="checkbox"/> Tür mit Seitenteil(e) links / rechts *	1230 – 2769	1685 – 3015	510 – 1365	1605 – 2829 / 4500	1740 – 3070
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil und Seitenteil(e) links / rechts *	1230 – 2769	1685 – 3015	510 – 1365	1605 – 2829 / 4500	1865 – 3070 / 3500
<input type="checkbox"/> Tür eingebaut in BS-Verglasung Z-19.14-1234	1230 – 2769	1685 – 2945	510 – 1365	1605 – 2829 / unbegrenzt	1865 – 3000 / 3000

* nicht zutreffendes streichen

1.0 Maßkontrolle Zusammenbau

Zargenaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Flügelaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Luftspaltkontrolle/Schattenfugen auf Bandseite gemessen:			
oben/li/re/mitte: 4 +2/-1 mm	Ja / Nein	unten: 7 ±5 mm	Ja / Nein

Anmerkung:

2.0 / 3.0 Profile

Werkstoffe entsprechend Stückliste:		Stabirahmen gemäß Werkplan / Stückliste:	Ja / Nein
Zarge Tür + Umfeld	Ja / Nein	Aufschäumer Palusol:	Ja / Nein
Flügel: Werkstoffe und Aufbau	Ja / Nein	Anleimer gemäß Stückliste:	Ja / Nein
Fertigung gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Verwendeter Kleber	Typ:		

Anmerkung:

4.0 Beschläge und Zubehör

Bänder gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Bänder je Flügel:	
Bandposition gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Schlösser gemäß Stückliste	Ja / Nein	Fallenspiel i.O.	Ja / Nein
Wenn NEIN : Schlosstyp (Artikelnr./ Bezeichnung):			
Lage + Befestigung lt. Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Zubehör (E-Öffner / Kontakte)			
Zubehör gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein

sonstiges Zubehör:

Türdrücker

gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Ausführung FSA (DIN 18273 / EN 179 / EN 1125)?	Ja / Nein	Typ:	
Drückerstift:			

Anmerkung:

Türschliesser / Türantrieb

gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Befestigungsart:			
Montageplatte (n):			
ggf. innenliegend Systemzubehör gemäß Vorgabe:	Ja / Nein		

Anmerkung / weitere Komponenten:

5. Füllung (Verglasung Paneel einschließlich Glasleiste und Dichtung)

Glastyp:

Glasdichtung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Ätzsiegel und Aufkleber vorhanden	Ja / Nein
Klotzmaterial gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein	Aufschäumer im Glasfalz (falls erforderlich)	Ja / Nein

Anmerkung:

6. Bodendichtung RS (nach DIN 18095)

Ausführung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Abdichtung / Dichteinheit nach Vorgabe:	Ja / Nein
-----------------------------	-----------	---	-----------

Anmerkung / weitere Komponenten:

7. Funktionsprüfung und Kennzeichen

Funktionsprüfung ausgeführt und i.O.:	Ja / Nein
Kennzeichen auf Flügel angebracht:	Ja / Nein

Anmerkung:

Mitgeltende Dokumente sind als ANLAGE zu dem Bericht abzuspeichern und auf Verlangen vorzulegen!

in Bezug genommene Stückliste / Werkauftrag exakte Bezeichnung / Auftragsnummer:	
---	--

Abweichungsbericht / Fehlerprotokoll	Ja / Nein
--------------------------------------	-----------

zugrundeliegendes Dok A zur Zulassung: wesentl. Materialien / Komponenten + die techn. Ausführung entspr. Dok A :	Ja / Nein
--	-----------

Eigenüberwachung ausgeführt am (Datum):		Anmerkung / Notizen:
---	--	-------------------------

Signatur / Unterschrift verantwortl. Mitarbeiter(in)
